

SOBREMESA | CARTA GANTT · 3 SEMANAS

15 días hábiles · fases, responsables, entregables y horas editables por diseñadora

ID	Fase	Actividad	Inicio	Fin	Responsable
01	Descubrimiento	Revisión crítica de ficha y definición de alcance		1	1 Equipo completo
02	Descubrimiento	Limpieza, auditoría y análisis del dataset		1	2 Diseñadora 1
03	Descubrimiento	Benchmark y mapa de alternativas		2	3 Diseñadora 2
04	Descubrimiento	Segmentación y priorización de escenario inicial		2	3 Diseñadora 1
05	Descubrimiento	Hipótesis, métricas y protocolo de validación		3	4 Diseñadora 1
06	Arquitectura	Criterios de seguridad, exclusión y consentimiento		3	4 Diseñadora 3
07	Arquitectura	Mapa del journey antes, durante y después de la mesa		4	5 Diseñadora 2
08	Arquitectura	System prompt y reglas de clasificación contextual		4	6 Diseñadora 3
09	Arquitectura	Arquitectura de información y flujo MVP		5	6 Diseñadora 2
10	Contenido	Taxonomía temática y niveles de profundidad		5	7 Diseñadora 3
11	Contenido	Biblioteca curada inicial de detonadores		6	8 Diseñadora 3
12	Diseño UX/UI	Wireframes mobile-first y modo mesa compartida		6	8 Diseñadora 2
13	Diseño UX/UI	Sistema visual accesible y baja estimulación		7	9 Diseñadora 2
14	Diseño UX/UI	Prototipo navegable de alta fidelidad		8	11 Diseñadora 2
15	IA y factibilidad	Arquitectura conceptual del agente y fallback		8	10 Diseñadora 1
16	IA y factibilidad	Casos de uso y escenarios de fallo / abuso		9	10 Diseñadora 3
17	Validación	Preparación de test contextual y reclutamiento		10	11 Diseñadora 1

18	Validación	Pruebas moderadas con escenarios de mesa	11	12 Equipo completo
19	Validación	Análisis de resultados y priorización de ajustes	12	13 Diseñadora 1
20	Iteración	Iteración de interfaz y sistema visual	13	14 Diseñadora 2
21	Iteración	Iteración de prompts, temas y salvaguardas	13	14 Diseñadora 3
22	Cierre	Video conceptual / relato de funcionamiento	14	15 Diseñadora 2
23	Cierre	Documentación, costos y roadmap de evolución	14	15 Diseñadora 1
24	Cierre	QA final, presentación y entrega integrada	15	15 Equipo completo


TOTAL HORAS ESTIMADAS POR DISEÑADORA



				SEMANA 1 - DESCUBRIMIENTO						SE
Entregable	Horas D1	Horas D2	Horas D3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	
Alcance y supuestos validados	4	3	3							
Datasheet y hallazgos verificables	6	3	2							
Matriz comparativa y diferenciación	3	5	3							
Usuario primario y contexto de mesa	4	3	3							
Hipótesis y protocolo observacional	5	2	3							
Política de temas y manejo de menores	3	3	5							
Journey presencial y puntos de fricción	3	5	3							
Prompt, reglas y ejemplos curados	3	3	6							
Mapa de pantallas y flujo principal	4	5	2							
Matriz de temas, vínculo y edad	3	3	6							
Banco inicial y variantes seguras	2	4	7							
Wireframes del recorrido prioritario	3	8	3							
Color, tipografía y componentes	2	8	4							
Prototipo de inicio, sesión y cierre	4	9	5							
Diagrama lógico y fallback sin IA	5	2	5							
Matriz de casos y respuestas seguras	4	2	5							
Guion, consentimiento y escenarios	5	3	3							

Observaciones y fricciones registradas	6	5	5
Hallazgos priorizados por impacto	5	4	4
Prototipo corregido y accesible	2	7	3
Prompt y contenidos depurados	3	2	6
Pieza conceptual o storyboard	2	5	4
Dossier y presupuesto parametrizable	6	3	3
Entrega final revisada	4	4	4
	91	101	97

MANA 2 • DISEÑO Y PROTOTIPO					SEMANA 3 • VALIDACIÓN Y CIERRE			
D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15

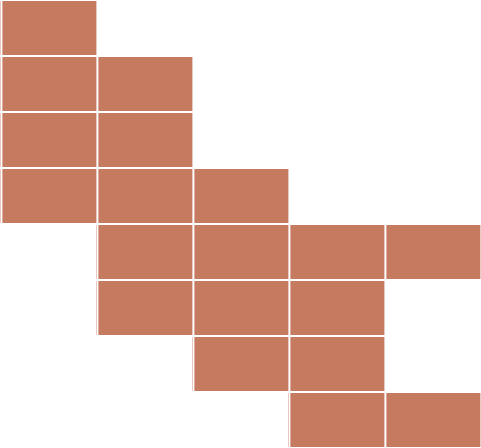



SOBREMESA | ESTRUCTURA DE COSTOS

Modelo editable en CLP: ingresa únicamente tarifas y gastos reales para obtener el presupuesto.

1. HONORARIOS PROFESIONALES • vinculados a la carta Gantt

Profesional	Responsabilidad principal	Horas del Gantt
Diseñadora 1	Investigación UX, estrategia, datos y validación	91
Diseñadora 2	Arquitectura, interfaz, sistema visual y prototipo	101
Diseñadora 3	Contenido conversacional, prompts y seguridad	97
SUBTOTAL HONORARIOS		289

2. GASTOS DIRECTOS DEL PROYECTO • no asumir valores no entregados

Concepto	Alcance / condición	Cantidad
Licencias o herramientas de diseño	Solo si se requiere contratar una licencia adicional	
Uso de modelo / API generativa	Solo si se realizan llamadas reales a un proveedor	
Validación con participantes	Solo si se aprueban incentivos o gastos de prueba	
Producción de video conceptual	Solo si existe un servicio o herramienta pagada	
Infraestructura / publicación	Solo si se decide publicar una implementación real	
SUBTOTAL GASTOS DIRECTOS CONFIRMADOS		

3. RESUMEN ECONÓMICO Y CONTINGENCIA OPCIONAL

Horas totales del equipo

Subtotal honorarios
Subtotal gastos directos confirmados
Contingencia opcional (%)
Monto contingencia

TOTAL PROYECTO

Tarifa por hora CLP	Subtotal CLP	Estado	Criterio
		PENDIENTE TARIFA	Tarifa real por definir; no inferida
		PENDIENTE TARIFA	Tarifa real por definir; no inferida
		PENDIENTE TARIFA	Tarifa real por definir; no inferida
		INCOMPLETO	

Valor unitario CLP	Subtotal CLP	Estado	Observación
		PENDIENTE / NO APLICA	Registrar solo gasto confirmado
		PENDIENTE / NO APLICA	Registrar solo gasto confirmado
		PENDIENTE / NO APLICA	Registrar solo gasto confirmado
		PENDIENTE / NO APLICA	Registrar solo gasto confirmado
		PENDIENTE / NO APLICA	Registrar solo gasto confirmado
		\$0	

--	--	--	--

\$0



SOBREMESA | RESUMEN DE EJECUCIÓN

Planificación académica de tres semanas · supuestos explícitos y alcance verificable




RESUMEN DE PLANIFICACIÓN

Duración	3 semanas / 15 días hábiles
Equipo	3 diseñadoras gráficas profesionales
Alcance viable	Investigación, estrategia, diseño UX/UI, prototipo y validación inicial
No incluido como hecho	Aplicación productiva, desarrollo backend, despliegue y tarifas no informadas
Fecha de inicio	No proporcionada: la planificación usa días relativos D1-D15
Fuente de horas	Estimaciones de planificación por actividad; no son horas ejecutadas

CARGA ESTIMADA DEL EQUIPO

Profesional	Horas estimadas	Semana 1	Semana 2	Semana 3	
Diseñadora 1		91	38	35	37
Diseñadora 2		101	35	47	42
Diseñadora 3		97	36	46	37

Aviso: la distribución semanal muestra horas de tareas que se superponen con cada semana, por lo que no debe sumarse como si fueran horas prorrateadas. La fue



Horas por tarea que coincide con cada semana; pueden repetirse entre semanas

Horas por tarea que coincide con cada semana; pueden repetirse entre semanas

Horas por tarea que coincide con cada semana; pueden repetirse entre semanas

